

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**FASE 0: ARQUITECTURA Y BASE DE DATOS MULTI-DB**	**3,5 días**	**mié 7/10/26**	**lun 12/10/26**
2		0.1 Configuración e Integración de Arquitectura Multi-Base de Datos	2 días	mié 7/10/26	jue 8/10/26
3		0.2 Diseños de Modelos de Datos para Talleres, Inscripciones e	1,5 días	vie 9/10/26	lun 12/10/26
4		**TAL-HU-01: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA**	**6,5 días**	**lun 12/10/26**	**mar 20/10/26**
5		1.1 Reglas de Negocio para Solicitud de Inscripción y	2 días	lun 12/10/26	mar 13/10/26
6		1.2 Integración de Lógica de Inscripciones con la Base de Datos	1,5 días	mié 14/10/26	jue 15/10/26
7		1.3 Interfaz de Catálogo de Talleres y Formulario de Solicitud	2 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26
8		1.4 Pruebas de Aceptación: Inscripción Directa y Límite de Lista de Espera	1 día	lun 19/10/26	mar 20/10/26
9		**HU-02 Y HU-03: GESTIÓN DE CUPOS Y CONTROL DE OCUPACIÓN EN TIEMPO REAL**	**3 días**	**mar 20/10/26**	**vie 23/10/26**
10		2.1 Algoritmo de Promoción Automática por Orden de Llegada	1,5 días	mar 20/10/26	mié 21/10/26

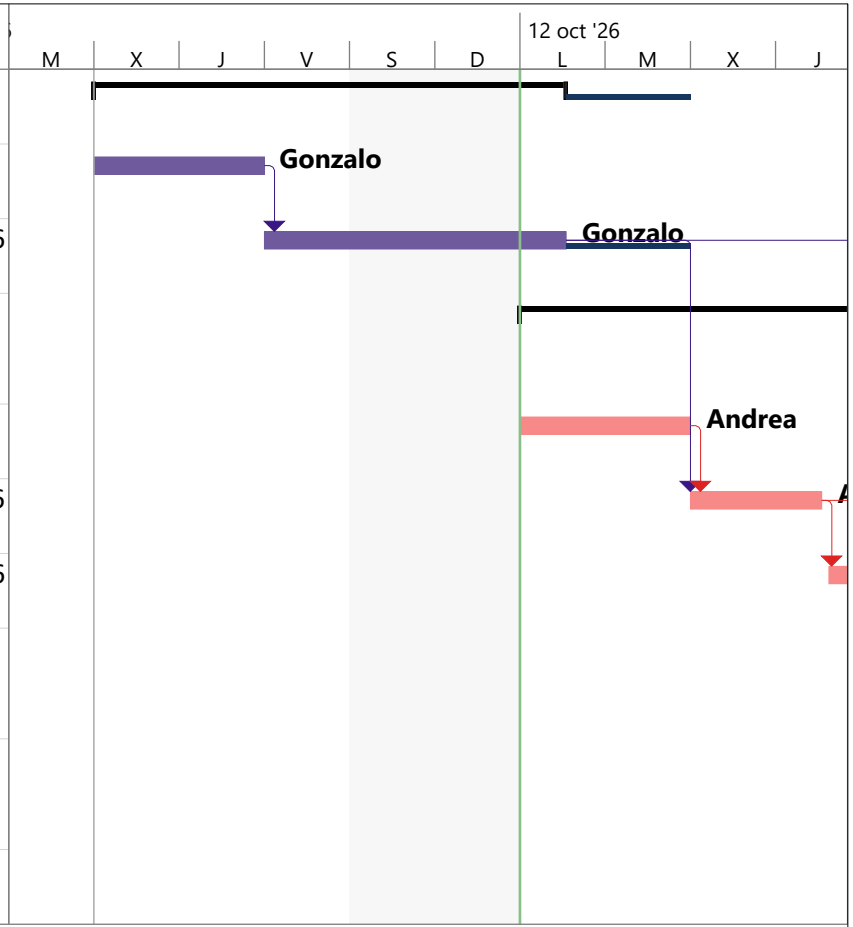

Proyecto: talleres
Fecha: lun 12/10/26

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
11		2.2 Panel del Coordinador para Monitoreo de Cupos y Ocupación	1 día	jue 22/10/26	jue 22/10/26
12		2.3 Pruebas de Integración: Promoción Automática al Modificar Cupos	0,5 días	vie 23/10/26	vie 23/10/26
13		**HU-06: CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES Y REGLA DE TIEMPO LÍMITE**	**2,5 días**	**vie 23/10/26**	**mar 27/10/26**
14		3.1 Regla de Cancelación (Límite Mínimo de 3 Horas Previas al	1,5 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26
15		3.2 Panel del Participante para Gestión y Confirmación de Cancelaciones	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
16		**HU-07 A HU-10: CONTROL OPERATIVO Y REGLA DE BANEO DE**	**2,5 días**	**mar 27/10/26**	**jue 29/10/26**
17		4.1 Algoritmo de Baneo Automático (>3 Cancelaciones en	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
18		4.2 Módulo de Administración Operativa y Gestión de Sanciones	1 día	mié 28/10/26	mié 28/10/26
19		4.3 Pruebas de Regla de Baneo: Simulación de Sanción y Bloqueo de Solicitudes	0,5 días	jue 29/10/26	jue 29/10/26
20		**HU-11: CONTROL Y REPORTE DE ASISTENCIA PARA INSTRUCTORES**	**1 día**	**mié 28/10/26**	**mié 28/10/26**

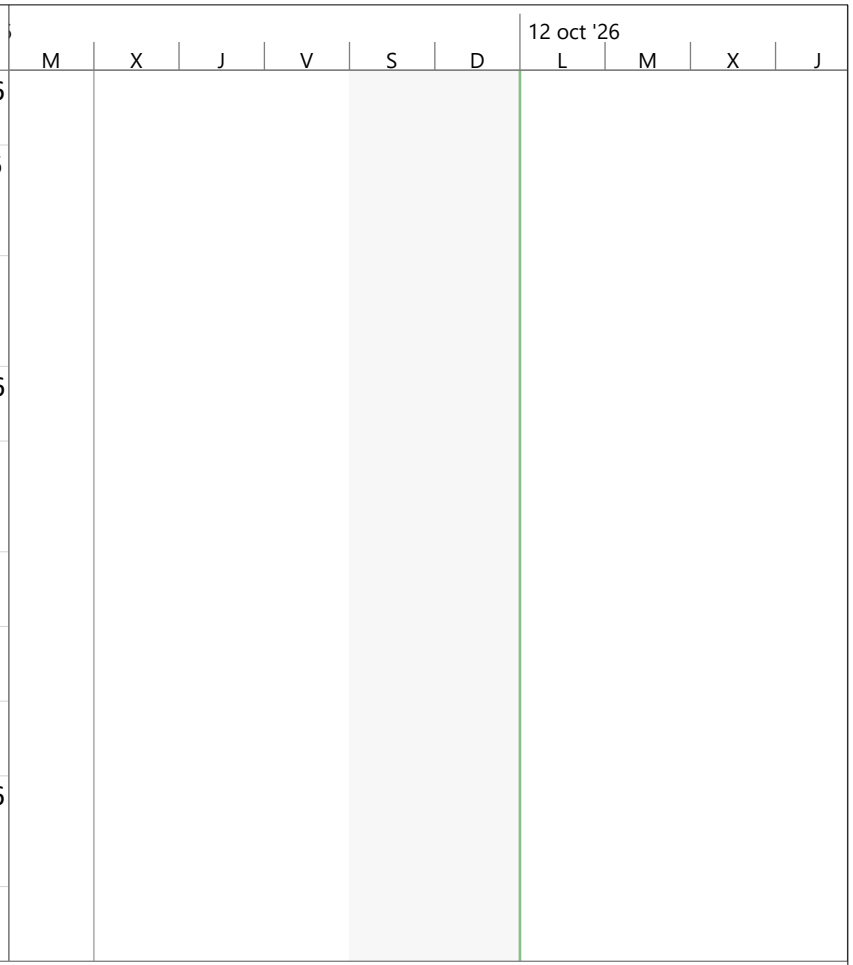

Proyecto: talleres
Fecha: lun 12/10/26


Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
21		5.1 Interfaz de Consulta y Reporte de Participantes Confirmados por	1 día	mié 28/10/26	mié 28/10/26
22		**FASE FINAL: PRUEBAS DE CONCURRENCIA, CARGA DE DATOS Y ENTREGA**	**4,5 días**	**jue 29/10/26**	**mié 4/11/26**
23		6.1 Validaciones de Concurrencia y Solicitudes Simultáneas	1,5 días	jue 29/10/26	vie 30/10/26
24		6.2 Carga Masiva de Datos de Prueba y Verificación Final del	1,5 días	lun 2/11/26	mar 3/11/26
25		6.3 Documentación Final, Manuales de Usuario y Presentación del Proyecto	1,5 días	mar 3/11/26	mié 4/11/26

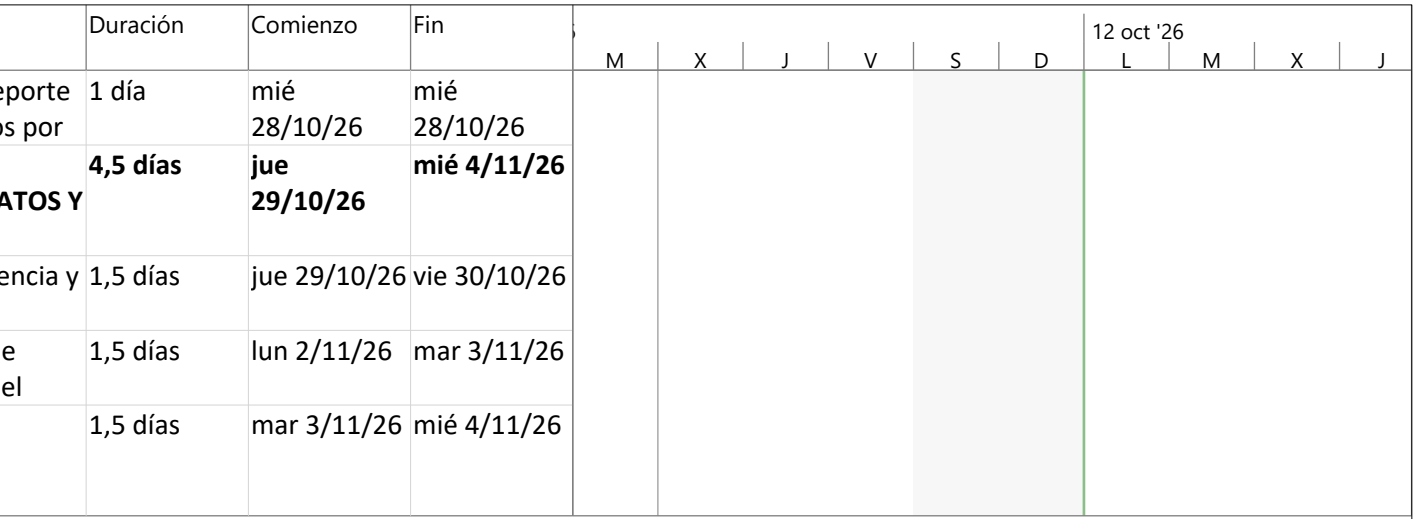


Proyecto: talleres
Fecha: lun 12/10/26

Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso manual
Tarea inactiva	solo fin	Margen de demora
Hito inactivo	Tareas externas	
Resumen inactivo	Hito externo	

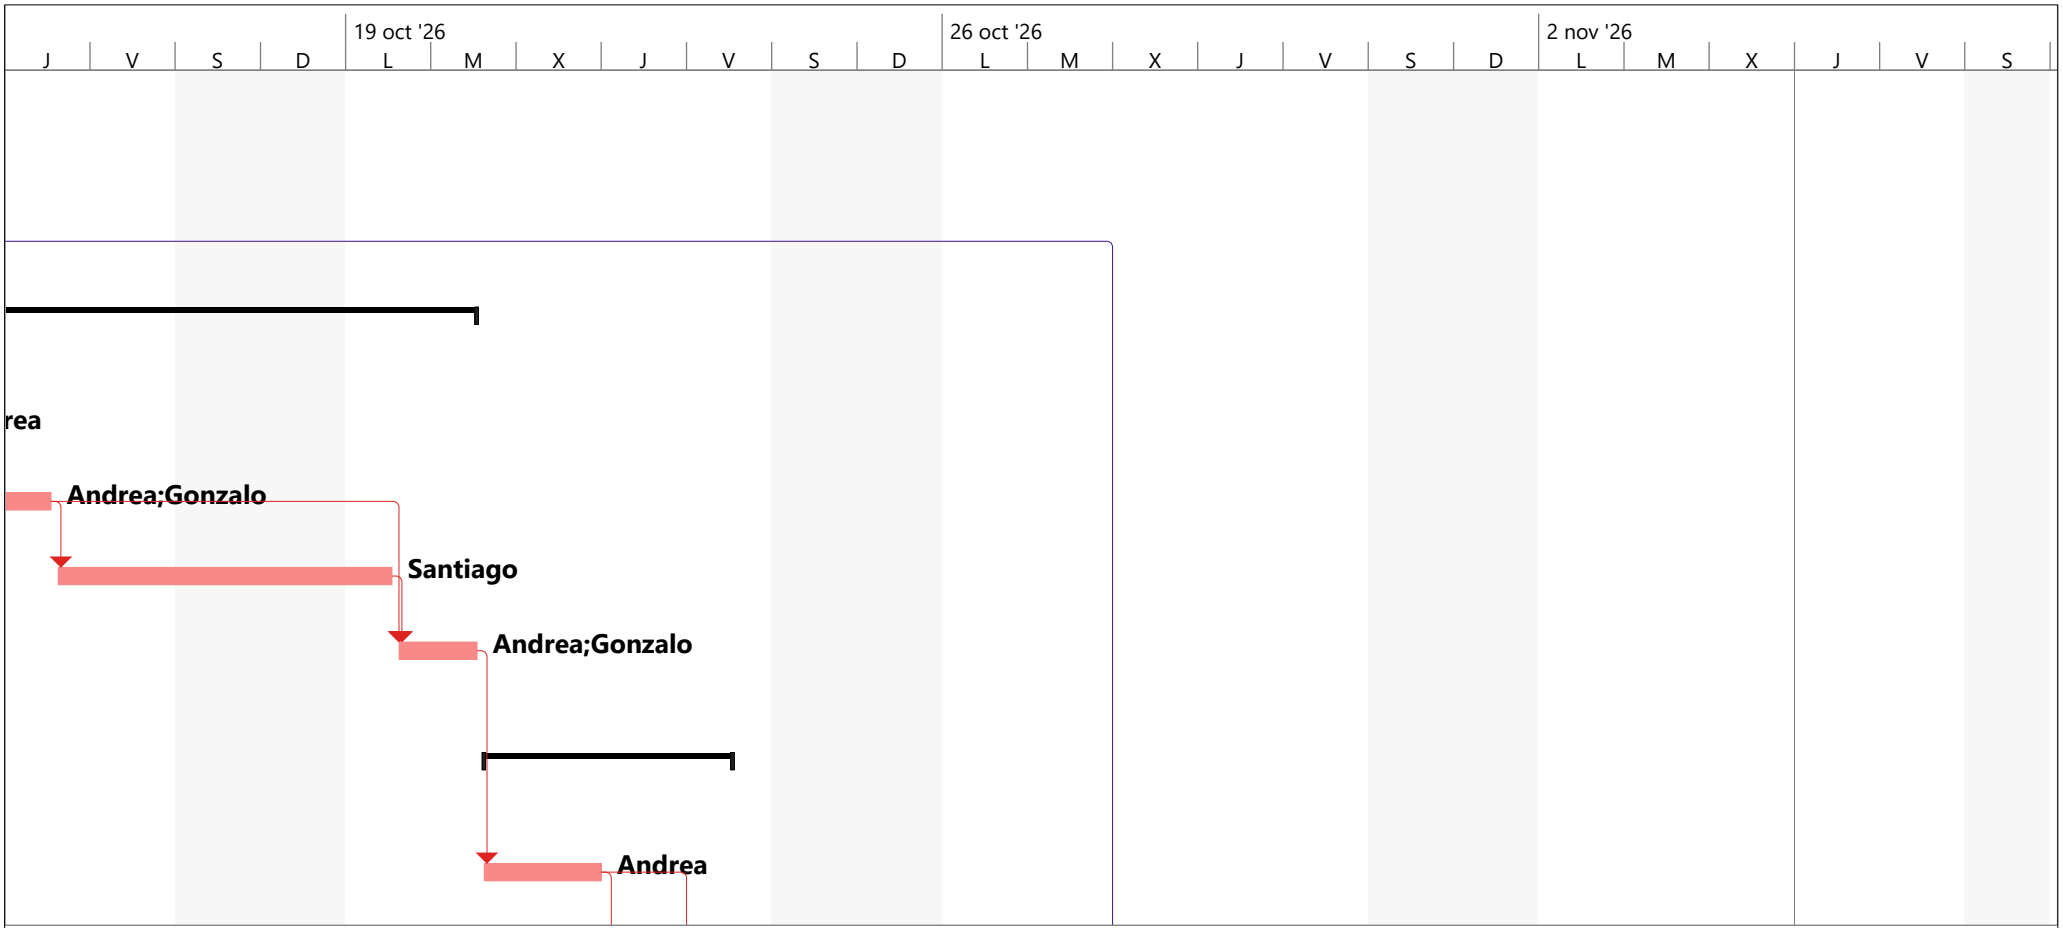


Proyecto: talleres
Fecha: lun 12/10/26

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

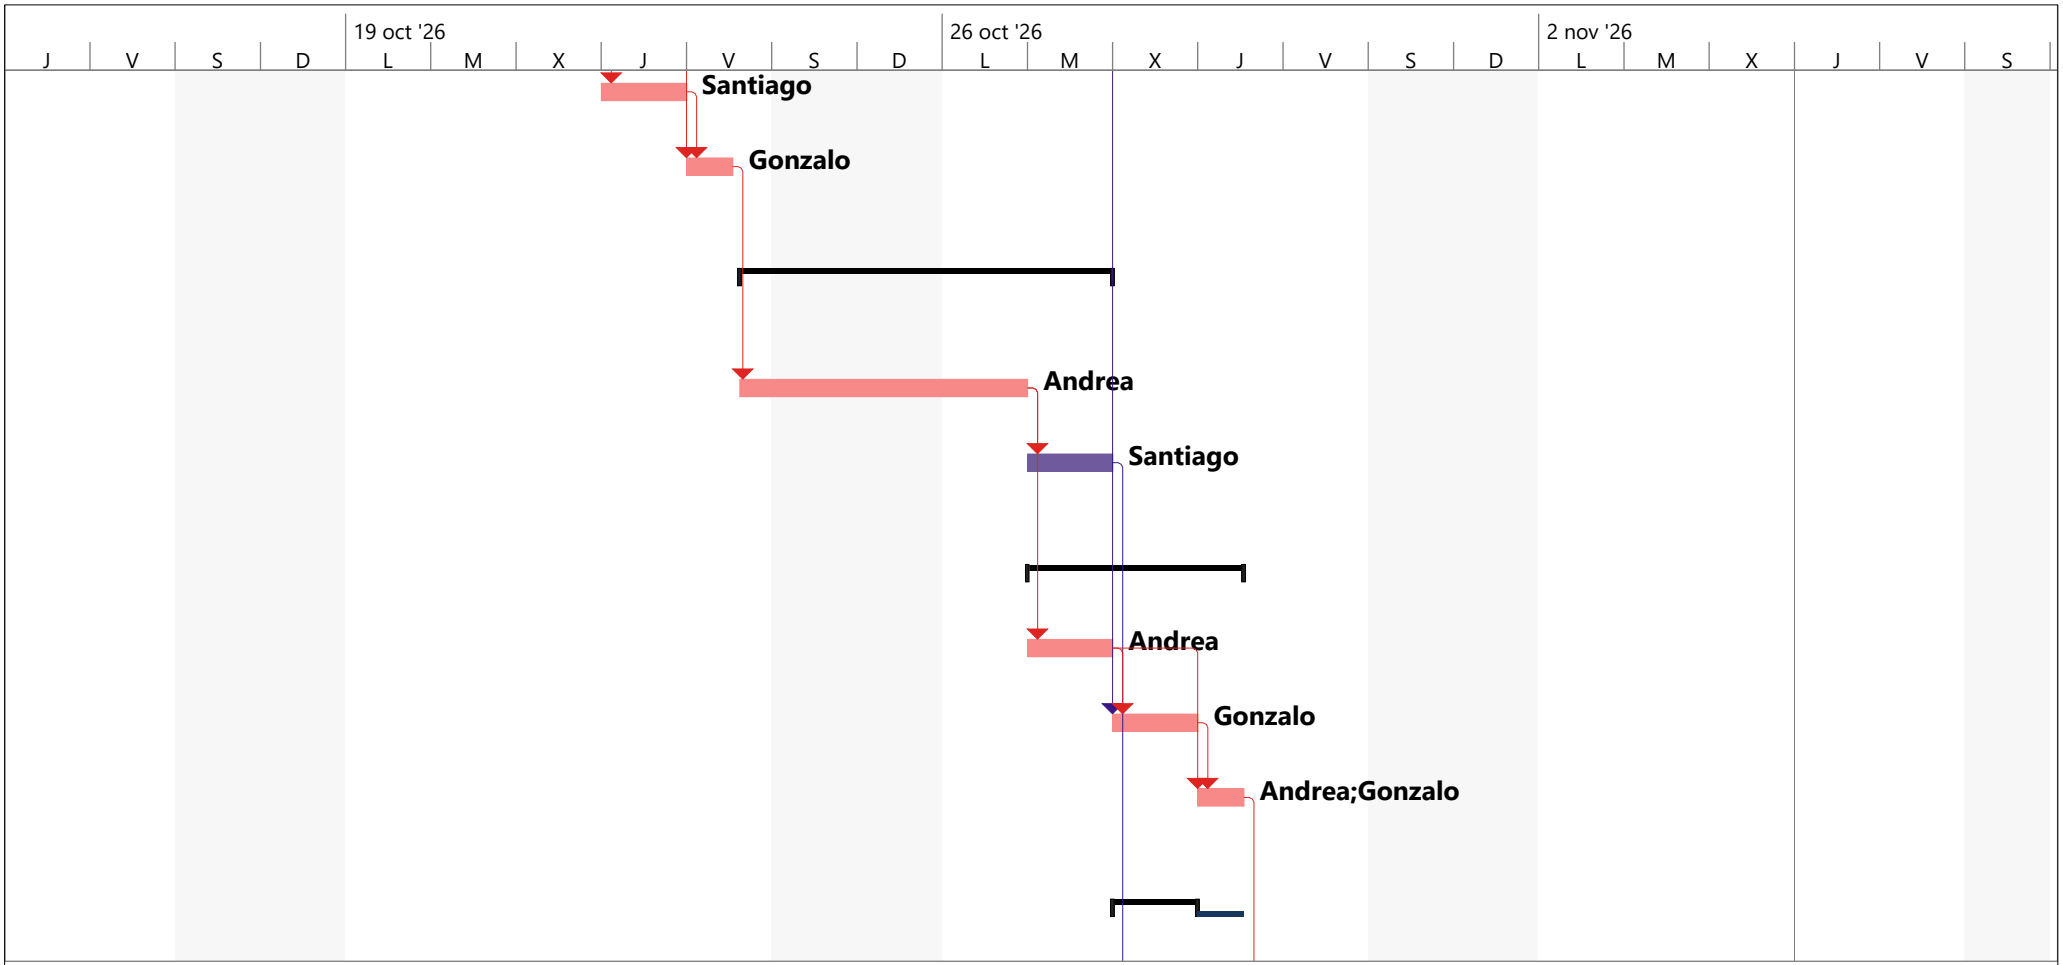

Proyecto: talleres
Fecha: lun 12/10/26

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

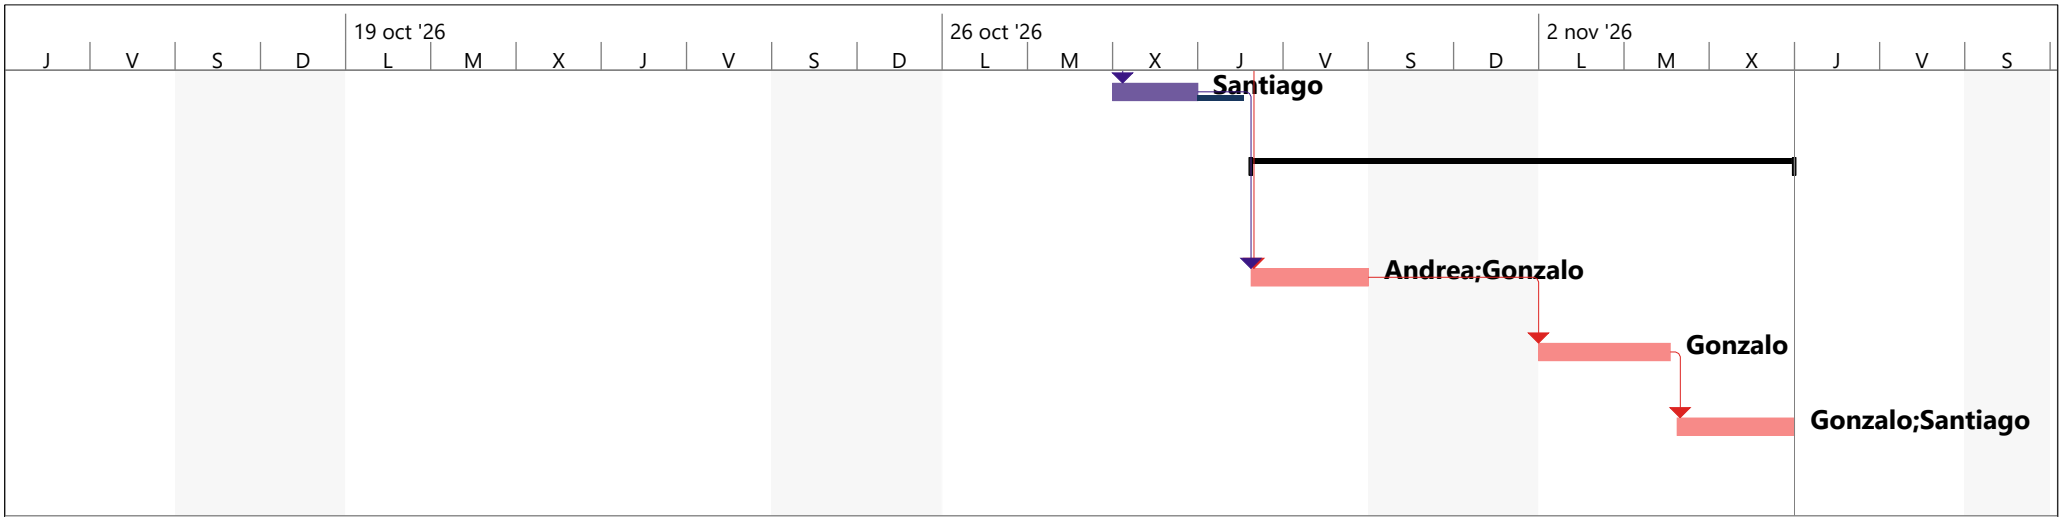

Proyecto: talleres
Fecha: lun 12/10/26

Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso manual
Tarea inactiva	solo fin	Margen de demora
Hito inactivo	Tareas externas	
Resumen inactivo	Hito externo	
